



## RELATÓRIO DE PROGRESSO – PIIM

### 1. Introdução

O presente relatório de progresso foi produzido com base nas recomendações da reunião por vídeo-conferência realizada ao 13 de Maio de 2020 entre os Governadores Provinciais e a Comissão Interministerial do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, sob orientação do Dr. Manuel Nunes Júnior, Ministro de Estado da Coordenação Económica. Reflete o ponto de situação e progresso das acções até 17 de Abril de 2022.

### 2. Carteira de Projectos

A Província tem **221** projectos inscritos no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, dos quais 4 de âmbito central e **217** Local do quais **22** DAD e **199** projectos PIP. Fez-se correcção houve um aumento na carteira de projectos isto no âmbito do Remanejamento. A carteira de projectos vai alterando em função da transferência de projectos de âmbito central para âmbito local e vice-versa.

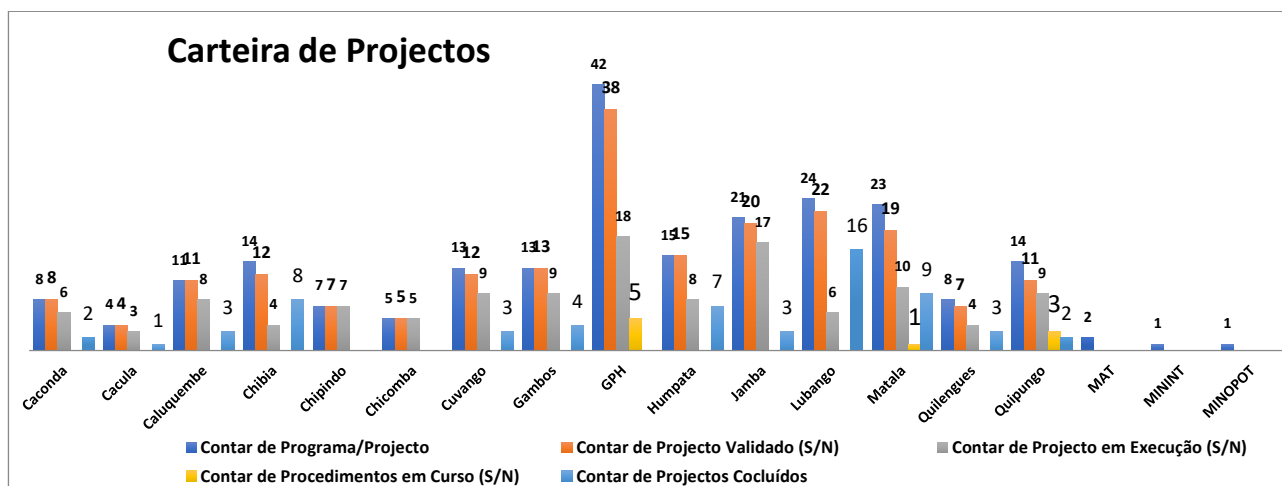


Figura 1-Carteira de projectos<sup>1</sup>

Foram remetidos à DNIP 221 projectos, 100 projectos concluídos, 115 projectos estão em execução, o que representa cerca de **96%** da carteira de projectos da Província, 5 Projectos estão em procedimentos concursais, a nível Central está em execução o projecto da Construção de 4 pontes e reabilitação de estrada no município de Caconda, 1 projectos de Construção e Apetrechamento das

<sup>1</sup> Fonte: Administrações Municipais e SIGFE

Infraestruturas autárquicas no Município do Chipindo, a Construção da cadeia da Matala, a Construção de Infraestruturas e Apetrechamento das Infraestruturas autárquicas no Município do Cuvango recentemente consignada.

## Execução Financeira

A Província tem uma execução financeira de **AKZ 35.204.712.369,66 (Trinta e Cinco Mil Milhões, Duzentos e Quatro Milhões, Setecentos e Doze Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Kwanzas e Sessenta e Seis Cêntimos)**.

## Carteira de Projectos

A Província da Huíla tem uma carteira diversificada de projectos, com incidência nos sectores da agricultura, habitação, cultura, ambiente, equipamentos sociais, energia e águas, saúde, educação e vias de comunicação.

### a) Carteira de Projectos

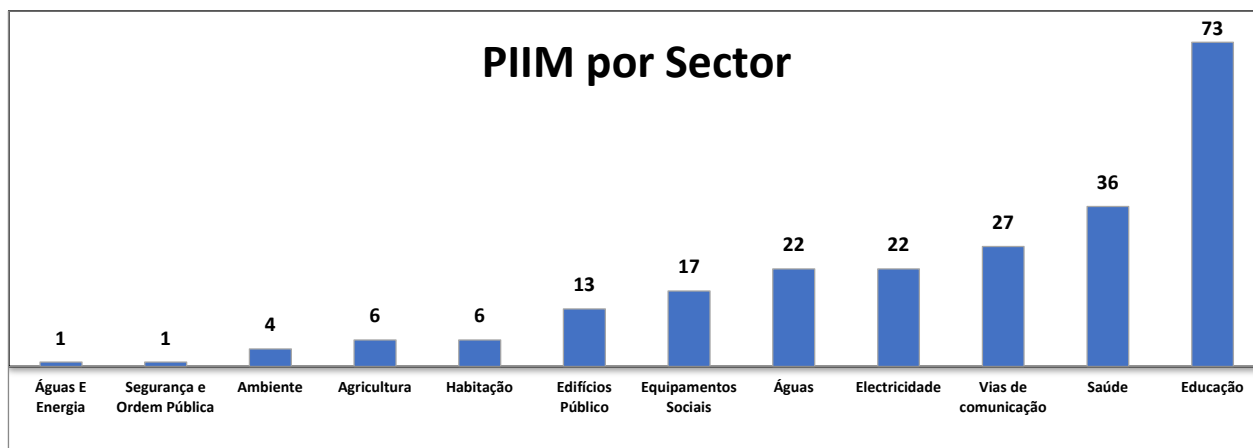


Figura 1- Distribuição dos projectos por sectores

- I. O sector da educação detém cerca de 32% da carteira de projectos da Província. São projectos de visam a construção e apetrechamento de escolas de 7 e 12 salas de aula.
- II. O sector da saúde é o segundo com mais projecto (16%). Trata-se da construção de hospitais municipais, centros e postos médicos a nível dos 14 Municípios da Província.
- III. No sector de energia destaca-se os projectos de reabilitação e ampliação dos sistemas de distribuição de energia a nível das sedes de alguns Municípios.
- IV. Perspectiva-se também a construção de fogos habitacionais e casas evolutivas, de modo a melhorar as condições de habitabilidade das populações, com urbanização, saneamento básico e energia e água.

V. O PIIM também visa apoiar a agricultura, familiar, com a aquisição de insumos e equipamentos necessários a produção.

b) Financiamento

O financiamento PIIM para a Província ascende em mais de Akz 50 Mil Milhões de Kwanzas, Distribuídos em 11 sectores.

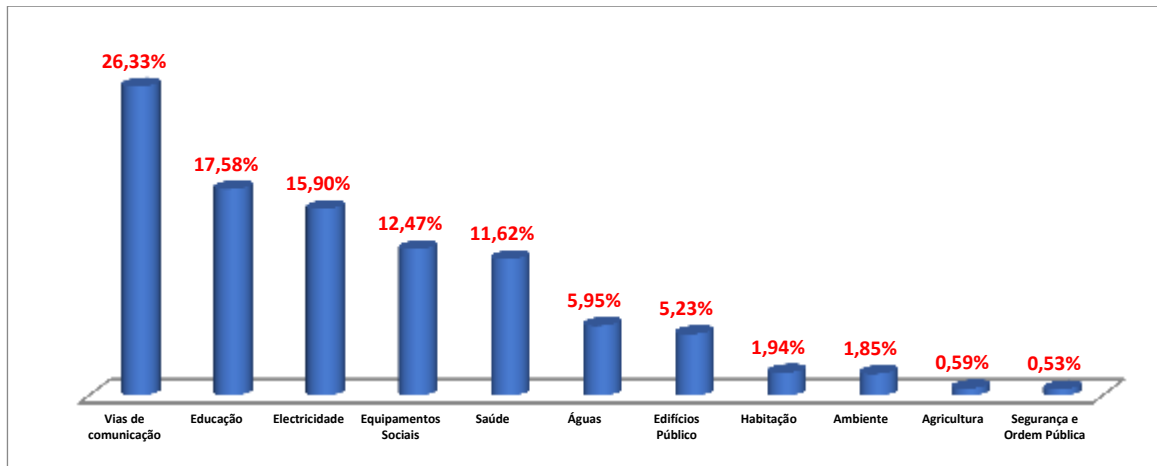


Figura 5 – Financiamento por sector

- I. O sector de vias de comunicação detém cerca de **26%** do valor do financiamento, em função do custo elevado dos projectos de estrada de terra e asfalto. Neste sector destaca-se a asfaltagem de algumas sedes municipais e a reabilitação de troços de ligam as zonas produtivas aos grandes mercados.
- II. A seguir ao sector de vias de comunicação, destacam-se os sectores de energia, educação, saúde e águas.

### 3. Empregabilidade

A implementação do PIIM a nível da Província da Huíla pode permitir criar cerca de 5.148 postos de trabalho permanente e temporário ao longo dos anos 2020 e 2022, dar nota o aumento do número de empregos deve-se ao aumento do número de projectos que a província ganhou.

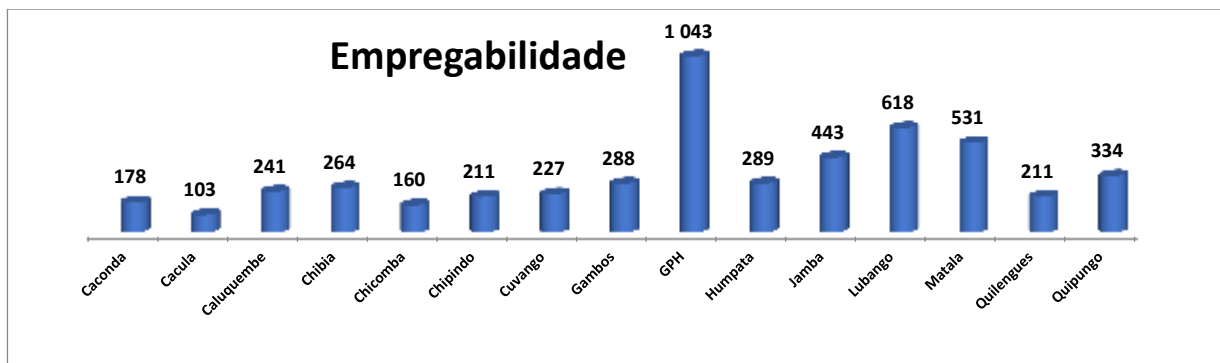


Figura 7 - Empregabilidade Unidade Orçamenta/Município

Os sectores de Infraestruturas e educação são os que mais empregam, com respectivamente 31,4% e 28,1% dos postos de trabalhos previstos no âmbito do PIIM. Este facto se justifica muito pelo número de projectos e sua tipicidade.

Perspectiva-se um aumento da oferta de emprego que vai provocar um aumento do salário nominal. Medidas de contenção de inflação se recomenda para não por em causa o salário real e não condicionar os efeitos positivos do aumento do emprego.

#### 4. Principais constrangimentos e conclusões

De modo geral o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios a nível da Província da Huíla decorre da melhor maneira, com 96% da carteira de projectos já em execução mais de **30 Mil Milhões de Kwanzas** alocados em vários projectos nos sectores da educação, saúde, Infraestruturas, energia e águas.

A Província já concluiu **91** projectos no âmbito do PIIM nomeadamente:

Nº	Unidade Orçamental	Tipo	Programa/Projecto
1	Matala	DAD	Aquisição De Embarcações Artesanais De Pesca Marítma, Para Apoio As Cooperativas
2	Matala	DAD	Aquisição De Imputs Agrícola
3	Matala	DAD	Aquisição De Medicamentos, Materiais Gastáveis E Equipamentos
4	Matala	DAD	Apetrechamento De Unidades Hospitalares.
5	Cuvango	DAD	Aquisição De Bombas E Painéis Solares Para Melhoramento Dos Sistemas De Água
6	Caluquembe	DAD	Aquisição de materiais para manutenção de 10 escolas do Ensino Primário
7	Caluquembe	DAD	Aquisição E Montagem De Grupos De Geradores
8	Chibia	DAD	Aquisição De Carteiras E Mobiliário Escolar Do Município
9	Gambos	DAD	Aquisição De Dois Tratores Com As Respectivas Alfaias
10	Humpata	DAD	Apetrechamento De Um Posto Médico
11	Humpata	DAD	Apetrechamento Do Hospital Municipal Da Humpata
12	Quiquungo	DAD	Aquisição De Carteiras Escolares
13	GPH	DAD	Aquisição de peças sobressalentes para a brigada de terraplanagem

14	GPH	DAD	Aquisição de Diversos Materiais De Energia e Água
15	Matala	PIP	Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 7 Salas De Aulas No Capelongo-Matala
16	Matala	PIP	Construção E Apetrechamento De Uma Escola No Hossi
17	Matala	PIP	Reabilitação E Ampliação Da Escola Do Nguendje
18	Matala	PIP	Construção Do Centro De Produção De Espécies Vegetais No Município Da Matala / Fase 1
19	Matala	PIP	Reabilitação Do Posto De Saúde, Na Comuna Do Micosse, Município Da Matala
20	Matala	PIP	Reabilitação Do Posto De Saúde, Na Localidade Do Matuntu, Comuna De Mulondo
21	Matala	PIP	Reabilitação, Ampliação E Apetrechamento Do Posto Para Centro De Saúde, Na Comuna Sede Da Comuna Do Mulondo
22	Matala	PIP	Asfatação Das Vias Da Vila Da Matala
23	Matala	PIP	Reabilitação Das Vias De Acesso Às Comunas
24	Chipindo	PIP	Construção De Sistemas De Água No Município Do Chipindo
25	Chipindo	PIP	Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas De Aulas Na Sede Do Município-Chipindo
26	Chipindo	PIP	Reabilitação, Ampliação E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Chipindo
27	Chipindo	PIP	Construção De Um Posto Policial Na Sede Do Município De Chipindo
28	Jamba	PIP	Reabilitação E Ampliação Da Rede De Distribuição De Energia E Iluminação Pública
29	Jamba	PIP	Construção De Uma Ponte Em Cassinga-Jamba
30	Jamba	PIP	Construção De Uma Ponte No Dongo-Jamba
31	Jamba	PIP	Construção De 1 Posto De Saúde Na Comuna no Dongo
32	Jamba	PIP	Construção De Pontes Na Jamba
33	Cuvango	PIP	Melhoramento e extensão da rede de distribuição de água (ETA) para 500 famílias
34	Cuvango	PIP	Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas, comuna do Galangue, Município De Cuvango
35	Cuvango	PIP	Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 7 Salas No Galangue - Cuvango
36	Caconda	PIP	Conclusão Da Construção De 1 Escola De 4 Salas-Caconda
37	Caconda	PIP	Conclusão Da Construção De 1 Posto De Saúde-Caconda
38	Cacula	PIP	Reabilitação E Ampliação Da Rede De Distribuição De Energia E Iluminação Pública-Cacula
39	Cacula	PIP	Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas De Aulas Na Sede Do Município-Cacula
40	Cacula	PIP	Reabilitação, Ampliação E Apetrechamento Do Hospital De Cacula
41	Cacula	PIP	Asfatação da Vila
42	Caluquembe	PIP	Construção De 7 Salas De Aulas Na Comuna Do Ngola No Município De Caluquembe
43	Caluquembe	PIP	Conclusão Da Construção Da Administração Municipal De Caluquembe
44	Quilengues	PIP	Construção e apetrechamento escola de 12 salas sede Matala/Huíla
45	Quilengues	PIP	Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Sede De Quilengues
46	Quilengues	PIP	Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município Sede De Quilengues
47	Chibia	PIP	Ampliação Do Sistema De Abastecimento De Água Da Vila
48	Chibia	PIP	Reabilitação E Ampliação Da Rede De Distribuição De Energia E Iluminação Pública
49	Chibia	PIP	Construção De Mais 5 Salas Na Escola Primária 167 Na Vila Da Chibia
50	Chibia	PIP	Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas De Aulas No Bairro Cinzento
51	Chibia	PIP	Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 7 Salas De Aulas No Município Sede
52	Chibia	PIP	Construção Da Administração Comunal Da Quihita
53	Chibia	PIP	Construção De Uma Escola De 12 Salas Na Vila Da Chibia Para O II Ciclo

54	Chibia	PIP	Conclusão Do Posto De Saúde Da Comuna Da Quihita
55	Gambos	PIP	Construção E Ampliação Do Sistema De Água Da Localidade Da Caíla No Município Dos Gambos
56	Gambos	PIP	Construção E Apetrechamento De Escola De 12 Salas De Aulas No Município Dos Gambos
57	Gambos	PIP	Construção E Apetrechamento De Escola De 7 Salas De Aulas No Município Dos Gambos
58	Gambos	PIP	Asfatação Das Vias Da Vila De Gambos
59	Lubango	PIP	Ampliação Do Cemitério Municipal Do Mutundo/Lubango
60	Lubango	PIP	Construção De Um Cemitério Municipal Na Eiwa-Lubango
61	Lubango	PIP	Construção Do Mercado Do Peixe
62	Lubango	PIP	Sistema De Electrificação Nos Bairros Da Tchavola, Kwawa E Tchituno Para 300 Casas Cada
63	Lubango	PIP	Construção De Uma Escola De 12 Salas De Aulas Do Bairro Sófrio-Lubango
64	Lubango	PIP	Construção e apetrechamento escola de 12 salas Lubango (Machiqueira Mapunda)/Huíla
65	Lubango	PIP	Construção De Uma Escola De 12 Salas De Aulas Na Quilemba, Município Do Lubango
66	Lubango	PIP	Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 7 Salas Na Sede Do Município-Lubango
67	Lubango	PIP	Construção E Apetrechamento De Uma Escola Primária No Bairro Da Tchavola
68	Lubango	PIP	Reabilitação E Ampliação Do Aterro Sanitario No Município Do Lubango
69	Lubango	PIP	Conclusão Do Posto De Saúde Da Machiqueira-Lubango
70	Lubango	PIP	Construção E Apetrechamento De Um Centro De Saúde No Bairro Do Tchioco
71	Lubango	PIP	Reabilitação E Ampliação Do Posto De Saúde Do Bairro Da Mapunda
72	Lubango	PIP	Reabilitação E Ampliação Do Posto De Saúde Do Bairro Sófrio
73	Lubango	PIP	Reabilitação De Estradas Secundárias E Terciárias Nos Bairros Da Cidade Do Lubango
74	Lubango	PIP	Reparação de ruas nos bairros da Tchavola, Kwawa e Tchituno (30 km)
75	Humpata	PIP	Construção Da Base Da Subestação Eléctrica
76	Humpata	PIP	Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 7 Salas De Aulas No Município- Palanca, Calumue I
77	Humpata	PIP	Construção E Apetrechamento Da Escola De 7 Salas De Aula No Bairro Da Hongo- Humpata
78	Humpata	PIP	Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas De Aulas No Município Sede, Onkuluvala
79	Humpata	PIP	Conclusão E Apetrechamento Da Escola De 7 Salas De Aula Na Comuna Da Palanca- TAKA
80	Humpata	PIP	Construção E Apetrechamento De Um Posto Médico Humpata- Neves
81	Humpata	PIP	Conclusão Da Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal Da Humpata
82	Humpata	PIP	Asfatação Das Vias Da Vila Humpata
83	Chicomba	PIP	Reabilitação E Ampliação Da Rede De Distribuição De Energia E Iluminação Pública- Chicomba
84	Quipungo	PIP	Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Quipungo
85	Quipungo	PIP	Conclusão Da Obra Da Loja De Registo-Quipungo
86	Quipungo	PIP	Reabilitação Da Ponte Do Cancovo
87	GPH	PIP	Reabilitação de Uma escola de 7 Salas de Aulas na Taka-Gambos
88	GPH	PIP	Construção de Pequeno Sistema de Água na Escola de 12 Salas na Palanca
89	GPH	PIP	Conclusão da Construção de 6 salas de aula no ISCED
90	GPH	PIP	Construção de um Laboratório no ISCED
91	GPH	PIP	Construção de Uma Escola de 07 Salas de Aulas na Sede Comunal do JAU

Lubango, 17 de Abril de 2022.

## A TASK FORCE PROVINCIAL
